

Campania, Napoli, 20/09/2021

ANAS, CAMPANIA: AGGIORNAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

Icona comunicati gallerie


Al via le attività impiantistiche, nell'ambito dei lavori di manutenzione programmata in corso nella galleria Vittoria di Anas.

Le attività – che prendono il via nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas – avranno una durata di circa 40 giorni e proseguiranno in orario notturno fino alle ore 2.00 circa, con l'implementazione di un'ulteriore turnazione lavorativa composta da sei unità operative.

Nella mattinata di oggi, inoltre, sono stati consegnati in cantiere i primi 5000 metri quadrati di reti di protezione, la cui posa in opera – in relazione all'avanzamento dei lavori impiantistici – prenderà il via in orario diurno già a partire da mercoledì prossimo.

Dalla prossima settimana, poi, si darà avvio anche alla posa in opera delle carpenterie metalliche (la cui produzione risulta in fase di ultimazione) a sostegno dei rivestimenti dei piedritti, sia nelle parti demolite che nei rivestimenti superiori.

I lavori avanzano nel rispetto della ultimazione, fissata in 120 giorni complessivi.

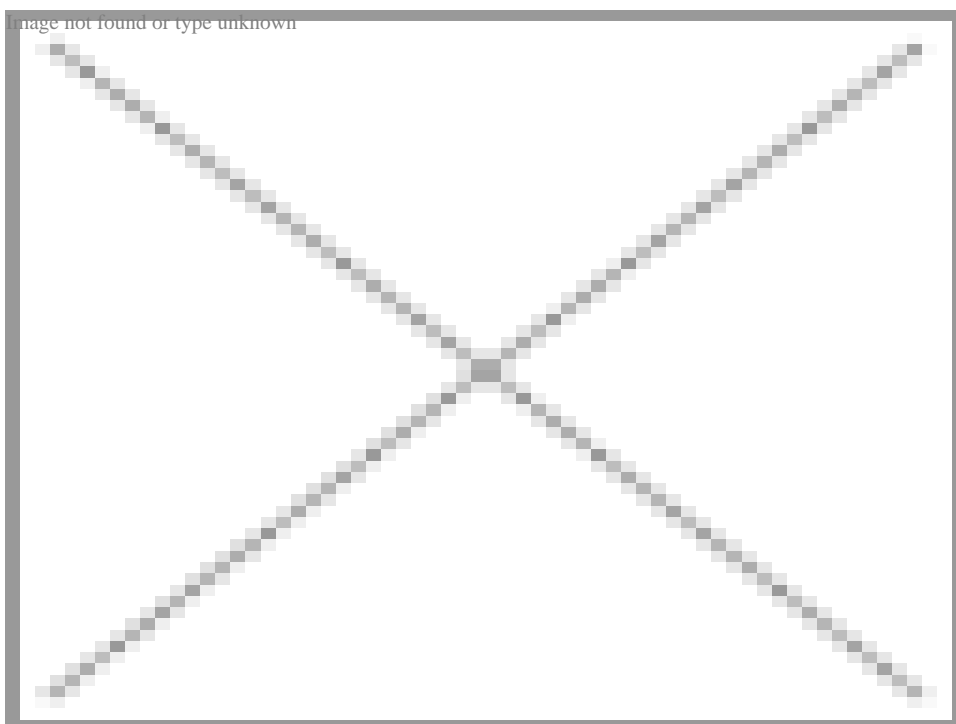

[1]



[2]



[3]

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_143.jpg

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_125.jpg

[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/3_83.jpg
